

«19» июня 2025 г.

г. Камышин

В соответствии со статьёй 7 Решения Камышинской городской Думы «О Контрольно-счётной палате городского округа – город Камышин» от 29.09.2011 № 38, на основании Решения о проведении параллельного контрольного мероприятия контрольно-счётной палатой Волгоградской области и контрольно-счётными органами муниципальных образований Волгоградской области от 16.12.2024 года, проведена проверка законности и эффективности использования средств, направленных на реализацию по соответствию зданий и прилегающей территории образовательных учреждений государственным нормам и требованиям, обеспечивающим безопасные условия воспитания, обучения и получения дополнительного образования за 2024 год.

1. Основание для проведения проверки - план работы на 2025 год, утверждённый распоряжением Председателя Контрольно-счётной палаты городского округа – город Камышин (далее – КСП) от 28.12.2024 № 9, уведомления от 22.01.2025 № 4, от 16.06.2025 № 21.

2. Наименование объекта контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 9 городского округа – город Камышин Волгоградской области (далее – МБОУ СШ № 9, Учреждение, Школа).

Юридический адрес Школы: 403886, Россия, Волгоградская область, г. Камышин, 6 мкр.,

д. 15.

3. Проверяемый период деятельности – 2024 год.

4. Наименование контрольного мероприятия: проверка законности и эффективности использования средств, направленных на реализацию по соответствию зданий и прилегающей территории образовательных учреждений государственным нормам и требованиям, обеспечивающим безопасные условия воспитания, обучения и получения дополнительного образования за 2024 год.

5. Сотрудники, осуществляющие контрольное мероприятие: начальник отдела КСП Ерофеева Н. В., консультант КСП Мазалова Е. А.

6. Срок проверки – с «27» января 2025 года по «11» февраля 2025 года, с «17» июня 2025 года по «19» июня 2025 года.

7. В ходе проверки составлен акт обследования (осмотра).

8. Должностные лица объекта контрольного мероприятия: директор МБОУ СШ № 9 Кузнецова Т. В., назначенный на должность приказом председателя Комитета по образованию Администрации городского округа – город Камышин от 11.09.2023 № 130-л;

- бухгалтерское обслуживание в проверяемом периоде осуществлялось на основании договора на бухгалтерское обслуживание от 01.01.2020 г. заключенного с муниципальным казенным учреждением «Центр финансового и методического сопровождения» (далее – МКУ ЦФМС).

9. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:

По вопросу 1. **Общая характеристика МБОУ СШ № 9**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 9 городского округа – город Камышин Волгоградской области (ИНН 3436106307, КПП 343601001, ОГРН 1023404968840) создано путём изменения типа существующего муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 9 городского округа – город Камышин Волгоградской области на основании постановления Администрации городского округа – город Камышин от 27.10.2011 № 2269-п.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным приказом Комитета по образованию Администрации городского округа – город Камышин (далее - Комитет по образованию) от 5 октября 2015 года № 678-о.

Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит цели извлечение прибыли целью своей деятельности.

Учредителем Учреждения является Администрация городского округа – город Камышин. Функции и полномочия учредителя осуществляет Комитет по образованию.

Учреждение относится к муниципальной собственности, права собственника осуществляет уполномоченный представитель – Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа – город Камышин (далее - КУИ).

Имущество Учреждения является муниципальной собственностью городского округа – город Камышин и закрепляется КУИ на праве оперативного управления.

Источниками формирования имущества Учреждения являются:

- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления;
- имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, в том числе за счет доходов, получаемых от приносящей доход деятельности;
- бюджетные поступления в виде соответствующих субсидий и субвенций;
- средства от оказания платных образовательных услуг;
- средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

Учреждение является юридическим лицом, имеет круглую печать, штампы, бланки самостоятельный баланс и (или) лицевые счета в Управлении финансов Администрации городского округа – город Камышин.

Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего образования в интересах человека, семьи, общества и государства, обеспечения охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и получении дополнительного образования.

Целями деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и направлений в соответствии с Уставом, осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья.

По вопросу 2. Выполнение муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением мероприятий в рамках исполнения заключенных соглашений с Комитетом по образованию городского округа – город Камышин

МБОУ СШ № 9 в проверяемом периоде мероприятие «Модернизация спортивных площадок в общеобразовательных организациях» осуществлялась в рамках подпрограммы «Развитие системы общего образования» муниципальной программы «Развитие образования», утвержденной постановлением Администрации городского округа – город Камышин от 31.12.2022 № 2140-п (далее – Подпрограмма, Муниципальная программа № 2140-п).

Утвержденный муниципальной программой № 2140-п объем финансирования на реализацию данного мероприятия составил 5 263,2 тыс. руб., из них:

- средства областного бюджета – 5 000,0 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа – город Камышин – 263,2 тыс. рублей.

Ожидаемым результатом реализации мероприятия является модернизация спортивных площадок в общеобразовательных организациях Волгоградской области, плановый срок реализации мероприятия – 3 квартал 2024 года.

На реализацию программных мероприятий Учреждениям образования решением Камышинской городской Думы от 05.12.2023 № 4/21 «О бюджете городского округа – город

Камышин на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – Решение о бюджете) (с учетом внесенных изменений от 18.12.2024 № 14/85) предусматривалось предоставление межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету городского округа - город Камышин из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (Приложение 3 к Решению о бюджете).

В соответствии с данным Решением субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на модернизацию спортивных площадок в общеобразовательных организациях Волгоградской области составила 5 000,0 тыс. рублей.

Объем финансирования на исполнение программного мероприятия предоставлен в виде субсидии на модернизацию спортивных площадок в общеобразовательных организациях на основании соглашения о предоставлении из бюджета городского округа – город Камышин муниципальному бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 29.12.2023 № 23 (с учетом внесенных изменений и дополнений, далее – Соглашение от 29.12.2023 № 23), заключенного между Комитетом по образованию и муниципальным образовательным учреждением в размере 5 263,2 тыс. руб., из них: код субсидии 8802280000 – 5 000,0 тыс. руб., код субсидии 0002280000 – 263,2 тыс. рублей.

Согласно Отчету о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на 31 декабря 2024 г. средства субсидии Учреждению поступили в размере 5 263,2 тыс. руб., в том числе: 5 000,0 тыс. руб. – средства областного бюджета (код субсидии 8802280000), 263,2 тыс. руб. – средства городского бюджета (код субсидии 0002280000).

Перечисление Комитетом по образованию средств, связанных с исполнением расходных обязательств, осуществлено платежными поручениями от 22.10.2024 № 74895 в сумме 263,2 тыс. руб. (городской бюджет), от 29.10.2024 № 76887 в сумме 5 000,0 тыс. руб. (областной бюджет).

Комитетом по образованию средства перечислены с соблюдением графика перечисления средств (Приложение № 2.1 к соглашению от 29.12.2023 № 23).

Средства МБОУ СШ № 9 в проверяемом периоде освоены в полном объеме.

Согласно отчету о достижении значений результатов предоставления субсидии по состоянию на 1 января 2025 года при плановом результате предоставления субсидии «количество общеобразовательных организаций в которых выполнены требования к антитеррористической защищенности 1-3 категории и требования антитеррористической защищенности в части оснащения инженерно-техническими средствами и системами охраны» – 1 ед., фактическое значение в отчете не заполнено.

Следует отметить, в отчете о достижении значений результатов предоставления субсидии по состоянию на 1 января 2025 г. от 09.01.2025 Учреждением в гр. 10, гр. 11 не указаны фактически достигнутые значения результатов предоставления субсидии при плановых значениях: с даты заключения Соглашения – 1 единица; из них с начала текущего финансового года – 1 единица.

Согласно пояснениям директора Учреждения факт некорректного составления отчета объясняется следующим: «При составлении отчета о достижении значений результатов предоставления Субсидии была допущена техническая ошибка, в графах 10-11 не отражены фактически достигнутые значения к соглашению о предоставлении из бюджета городского округа – город Камышин муниципальному бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации № 23 от 29.12.2023 г.

Считать фактически достигнутые значения равные плановым значениям».

По вопросу 3. Проверка установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» процедур заключения контрактов и договоров

МБОУ СШ № 9 закупки товаров, работ, услуг в рамках мероприятия муниципальной программы осуществлялись в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иными подзаконными актами, изданными во исполнение Федерального закона № 44-ФЗ.

Особенности закупок, осуществляемых, в том числе и бюджетными учреждениями, регламентированы ст. 15 Федерального закона № 44-ФЗ.

В соответствии с ч. 2 ст. 38 Федерального закона № 44-ФЗ, если совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (далее - контрактный управляющий).

Приказом директора МБОУ СШ № 9 от 11.09.2023 № 146-о «О назначении контрактного управляющего» должностные обязанности контрактного управляющего возложены на директора МБОУ СШ № 9 Кузнецову Т. В.

На контрактного управляющего представлено Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд (44 ФЗ)» в объеме 72 учебных часа, выданное АНО ДПО «ПЛАТФОРМА», регистрационный номер № 81864 от 05.03.2022 года.

Таким образом, Учреждением в проверяемом периоде приняты меры по поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионального образования должностного лица, занятого в сфере закупок, в том числе путем повышения квалификации или профессиональной переподготовки в сфере закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Уполномоченный специалист МБОУ СШ № 9 по простановке электронной подписи для размещения плана-графика на официальном сайте www.zakupki.gov.ru – директор Учреждения.

Квалифицированные сертификаты электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП):

- 29878747871266694917295327057885354807, период действия 21.09.2023 - 14.12.2024;

- 245096940908874853518544097866273965840, период действия 29.11.2024 - 22.02.2026.

Учреждением закупки осуществлялись на основании плана-графика закупок товаров, работ, услуг на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов (далее – план-график).

В соответствии с ч. 7 ст. 16 Федерального закона № 44-ФЗ план-график формируется муниципальным учреждением при планировании финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения и утверждается в течение десяти рабочих дней после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - ПФХД) муниципального учреждения.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов от 29.12.2023 (далее – План ФХД) Школе утверждён 29.12.2023 года. Анализ информации, размещённой на сайте закупок, показал, что план-график с объемом закупок в размере 17 101,8 тыс. руб. утвержден и размещён в единой информационной системе (далее – ЕИС) 11.01.2024 года, то есть с соблюдением сроков, установленных ч. 7 ст. 16 Федерального закона № 44-ФЗ.

В течение отчётного периода в план-график вносились изменения 13 раз, в результате чего объём финансового обеспечения на текущий финансовый год увеличился на 434,1 тыс. руб. и составил 17 535,9 тыс. рублей.

Изменения в план-график вносились в связи с изменением потребности в товарах (работах, услугах), а также доведенных до заказчика лимитов бюджетных обязательств, показателей планов (программ) ФХД, соглашений о предоставлении субсидий.

Однако Учреждением в нарушение п. 1 ст. 6, п. 1.1 ст. 10 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» при внесении изменений в план-график от 19.03.2024 № 4 не соблюден принцип конфиденциальности электронной подписи. Согласно таблице учета использования рабочего времени № 5 директор Школы в период с 11 по 21 марта 2024 года находился в отпуске.

Проверкой установленных Федеральным законом № 44-ФЗ процедур заключения контрактов и договоров установлено следующее:

МБОУ СШ № 9 в рамках выполнения мероприятия модернизация спортивных площадок в общеобразовательных организациях закупка осуществлена путем проведения электронного аукциона. Организатором закупки являлось Государственное казенное учреждение Волгоградской области «Центр организации закупок», заказчиком – МБОУ СШ № 9.

Извещение о проведении электронного аукциона размещено 10.07.2024 года с начальной (максимальной) ценой муниципального контракта (далее - НМЦК) в размере 5 263,2 тыс. рублей. В качестве обоснования НМЦК к извещению подкреплен локальный сметный расчет.

В извещении Учреждением установлено преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ, а именно при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) открытым конкурентным способом в извещении установлено преимущество участникам закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.

Согласно Протоколу подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по итогам проведенного электронного аукциона из шести ценовых предложений (из них соответствует требованиям – 5, отклонена – 1 из-за несоответствия участника закупки требованиям) победителем аукциона признан участник закупки с идентификационным номером 116960258, предложивший наиболее низкую цену контракта 4 263,2 тыс. рублей.

По результатам проведения открытого аукциона в электронной форме, на основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 22.07.2024 № 0329200062224005935 заключен муниципальный контракт от 05.08.2024 № 0329200062224005935 с Давтяном Варданом Паргеговичем.

Согласно сведениям из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Давтян Вардан Паргегович относится к категории «Микропредприятие», сведения об индивидуальном предпринимателе в реестр внесены 10.09.2019 года.

Кроме того, в рамках исполнения мероприятия по модернизации спортивных площадок в общеобразовательных организациях также осуществлены две закупки путем заключения договоров с единственным поставщиком:

- договор от 17.09.2024 № 13 на выполнение работ по устройству покрытия под воркаут площадку, заключенный с ИП Давтян Вардан Паргегович на сумму 570,55 тыс. руб.;
- договор от 17.09.2024 № 14 на выполнение работ по обустройству воркаут площадки, заключенный с ИП Бородин Николай Алексеевич на сумму 429,45 тыс. рублей.

В соответствии с объяснительной директора Школы «На «Модернизацию спортивной площадки на территории МБОУ СШ №9» было выделено 5 263 158 рублей. После проведения электронного аукциона, был заключен Контракт на сумму 4 263 157,98 рублей, что привело к экономии в размере 1 000 000,02 рублей. Было разрешено освоить эту сумму на оборудование воркаут площадки путем заключения прямых договоров: устройство покрытия под воркаут площадку – 550 570 рублей и оборудование воркаут площадки – 429 450,02 рублей. Таким образом, выделенная сумма была полностью освоена».

Данные закупки в нарушение пункта 1 постановления Администрации городского округа – город Камышин от 28.12.2019 № 1621-п «Об автоматизации закупок малого объема в городском округе – город Камышин» осуществлены вне электронного магазина (ОТС – Market).

Контракты (договоры) заключены на бумажном носителе на основании пункта 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

Согласно пунктам 3.2 договоров оплата производится за весь предусмотренный объем работы, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя не более чем в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке.

Установленный в договорах срок оплаты не соответствуют ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пункты 3.2 обоих договоров прописаны неверно. Срок оплаты должен составлять не более десяти рабочих дней с даты подписания документа о приемке, предусмотренного ч. 7 ст. 94 настоящего Федерального закона.

Обоими договорами не оговорены условия в части гарантийных обязательств (требования к гарантии качества товара, работы, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара).

Также договоры, заключенные с единственным поставщиком, имеют признаки искусственного дробления: договоры заключены в один день и работы выполнены на одном объекте.

Факт не размещения в электронном магазине закупок на выполнение работ по устройству покрытия под воркаут площадку и проведение работ по оборудованию воркаут площадки, директором Учреждения объясняется следующим:

«Произведя анализ рынка, было выявлено, что изготовление необходимого оборудования и проведение работ в сжатые сроки (до наступления заморозок) могут провести только данные организации, с которыми и были заключены договора.

В соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ закупка у единственного поставщика может осуществляться заказчиком на сумму, не превышающую 600 тыс. руб. без проведения конкурентных процедур.»

По вопросу 4. Проверка исполнения заключенных контрактов (наличие и обоснованность внесенных изменений, соблюдение сроков выполнения и оплаты работ, проведение претензионной работы, исполнение гарантийных обязательств)

В ходе проверки проверено исполнение заключенных контрактов на наличие и обоснованность внесенных в них изменений, соблюдения сроков выполнения и оплаты работ, проведение претензионной работы, а также исполнение гарантийных обязательств.

Проверкой исполнения заключенных контрактов (договоров) установлено следующее:

Как отмечалось, в рамках исполнения мероприятия по модернизации спортивных площадок в образовательных организациях, МБОУ СШ № 9 заключены следующие контракты (договоры):

*** Контракт от 05.08.2024 № 032900062224005935 с ИП Давтян В. П. (далее – подрядчик).**

Предметом контракта является выполнение работ по модернизации спортивной площадки (обустройство спортивной площадки). Место выполнения работ: 403886, Волгоградская область, г. Камышин, 6 микрорайон, дом 15.

Цена контракта составила 4 263,2 тыс. рублей.

Срок выполнения работ по контракту (п. 4.1 контракта, Приложение № 2 к контракту) предусмотрен с даты заключения контракта по 01.11.2024 года.

В соответствии с п. 6.9 контракта подрядчиком ИП Давтян В. П. представлено информационное письмо о подтверждении добросовестности поставщика, в связи с которым

освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта (ч. 8.1 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ).

Приемка работ по устройству покрытия под воркаут площадку на территории МБОУ СШ № 9 осуществлена по акту о приемке выполненных работ № 1 от 18.10.2024 в соответствии с ч. 13 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ. Акт о приемке выполненных работ размещен в ЕИС и подписан ЭЦП подрядчиком 18.10.2024. Датой подписания ЭЦП документа о приемке МБОУ СШ № 9 является также 18.10.2024.

Также к проверке представлен Акт о приемке выполненных работ от 16.10.2024 № 1 на бумажном носителе с подробным перечнем выполненных работ.

Работы подрядчиком выполнены с соблюдением сроков, установленных п. 4.1 контракта и Приложением № 2 к контракту.

Расчёты за выполненные работы Учреждением произведены в полном объёме на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3) от 16.10.2024 № 1 (за отчетный период с 06.08.2024 по 16.10.2024) платежными поручениями от 23.10.2024 № 75293 в сумме 213,2 тыс. руб. (средства городского бюджета) и от 30.10.2024 № 77084 – 4 050,0 тыс. руб. (средства областного бюджета).

Учреждением в нарушение пункта 2.4 контракта оплата просрочена на 2 календарных дня в сумме 4 050,0 тыс. руб. (срок оплаты по контракту 28.10.2024 включительно).

Учреждением в реестре контрактов информация и документы (акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ, платежные поручения) размещены с соблюдением сроков.

Согласно описанию объекта закупки (Приложение № 2 к контракту) Подрядчик обязан предоставить паспорта качества (сертификаты соответствия и т. п.) на применяемые материалы.

Подрядчиком представлены: сертификаты соответствия на камни бетонные и железобетонные бортовые, крошку резиновую фракции, полотно иглопробивное для устройства дренажа и конструктивных прослоек в дорожном строительстве, панельные ограждения GRAND LINE, оборудование спортивное для открытых площадок, органический пигмент; документы о качестве на асфальтобетонную смесь; паспорта на битум нефтяной дорожный, щебень из плотных горных пород песчаника фракции, на бордюр тротуарный; технические паспорта на стойки баскетбольные уличные усиленные со щитом из оргстекла, кольцом и сеткой, лавки парковые разборные 2 м без спинки, стойки волейбольные универсальные с механизмом натяжения, в стаканах с крышками; свидетельства на полиуретановое связующее SOSTAV Adhesive, полиуретановые лакокрасочные материалы, отвердители на основе алифатического полиизоцианата, краски и пропитки акриловые.

В соответствии с заключенным контрактом гарантийный срок на выполненные работы установлен в размере 60 месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке (п. 6.1.1 контракта и Приложение № 2 к контракту «Описание объекта закупки»).

*** Договор от 17.09.2024 № 13 с ИП Давтян В. П. (далее – подрядчик).**

Предметом контракта является выполнение работ по устройству покрытия под воркаут площадку. Состав и объем работ определен Приложением № 1 к договору (сметная документация).

Место выполнения работ: 403886, Волгоградская область, г. Камышин, мкр. 6-й, д. 15.

Цена договора составила 570,55 тыс. рублей. Источник финансирования: областной бюджет – 542,02 тыс. руб., городской бюджет – 28,53 тыс. рублей.

В соответствии с п. 2.1 договора срок выполнения работ: с даты заключения договора по 01.12.2024.

Выполненные работы по устройству покрытия под воркаут площадку приняты по акту о приемке выполненных работ от 17.10.2024 № 1 (отчетный период с 17.09.2024 по 17.10.2024). Подрядчиком работы выполнены своевременно.

Согласно п. 3.2 договора оплата производится за весь предусмотренный договором объем работы в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.

Расчёты за выполненные работы Учреждением произведены в полном объёме на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3) от 17.10.2024 № 1 (за отчетный период с 17.09.2024 по 17.10.2024) платежными поручениями от 23.10.2024 № 75292 в сумме 28,53 тыс. руб. (средства городского бюджета) и от 30.10.2024 № 77008 – 542,02 тыс. руб. (средства областного бюджета).

Учреждением в нарушение пункта 3.2 контракта оплата просрочена на 5 календарных дней в сумме 542,02 тыс. руб. (срок оплаты по контракту 25.10.2024 включительно).

Как отмечалось, договором гарантийный срок на выполненные работы не установлен.

*** Договор от 17.09.2024 № 14 с ИП Бородин Н. А. (далее – исполнитель).**

Предметом контракта является выполнение работ по обустройству воркаут площадки. Состав и объем работ определен Приложением № 1 к договору (сметная документация).

Место выполнения работ: 403886, Волгоградская область, г. Камышин, мкр. 6-й, д. 15.

Цена договора составила 429,45 тыс. рублей. Источник финансирования: областной бюджет – 407,98 тыс. руб., городской бюджет – 21,47 тыс. рублей.

В соответствии с п. 2.1 договора срок выполнения работ: с даты заключения договора по 01.12.2024.

Выполненные работы по обустройству воркаут площадки приняты по акту о приемке выполненных работ от 14.10.2024 № 1 (отчетный период с 17.09.2024 по 14.10.2024). Исполнителем работы выполнены с соблюдением срока, предусмотренного договором.

В соответствии с п. 3.2 договора оплата производится за весь предусмотренный договором объем работы в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.

Расчёты за выполненные работы Учреждением произведены в полном объёме на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3) от 14.10.2024 № 1 (за отчетный период с 17.09.2024 по 14.10.2024) платежными поручениями от 23.10.2024 № 75291 в сумме 21,47 тыс. руб. (средства городского бюджета) и от 30.10.2024 № 77009 – 407,98 тыс. руб. (средства областного бюджета).

Учреждением в нарушение пункта 3.2 контракта оплата просрочена на 8 календарных дней в сумме 407,98 тыс. руб. (срок оплаты по контракту 22.10.2024 включительно).

Как отмечалось, данным договором гарантийный срок на выполненные работы также не установлен.

В соответствии с ч. 6 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ в Учреждении приказом от 25.01.2023 № 11/1-о (с учетом изменений) создана приемочная комиссия по осуществлению приемки поставленного товара (работ, услуг) в составе 5 человек, утверждено Положение о Приемочной комиссии для приемки поставленного товара (работ, услуг), результатов отдельного этапа исполнения контракта при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд МБОУ СШ № 9 (далее – Положение о приемочной комиссии), а также форма акта приемки товаров (работ, услуг).

В соответствии с Положением о приемочной комиссии решение приемочной комиссии оформляется документом о приемке, который подписывается всеми членами приемочной комиссии, участвующими в приемке товаров.

Экспертиза результатов, предусмотренных контрактами (договорами), проводилась Учреждением своими силами путем оформления заключений проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом (договором).

В ходе проверки проверено наличие и своевременность составления актов приёмки товаров (работ, услуг) и заключений проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом (договором) (далее – заключение экспертизы).

В результате установлены следующие нарушения и недостатки:

* в нарушение п. 6.7 Положения о приемочной комиссии, утвержденная данным положением форма акта приемки товаров (работ, услуг), а также составленные Школой акты приемки товаров (работ, услуг) по соответствующим контрактам (договорам) не содержат реквизиты и сведения:

- место проведения приемки товаров (работ, услуг);
- наименование заказчика;
- наименование поставщика;
- номер и дату экспертизы;
- результаты голосования по итогам приемки товаров;

* заключения экспертизы не содержат номер экспертизы, место проведения и наименование учреждения, проводившего экспертизу.

Таким образом, фактические и кассовые расходы по исполнению мероприятия по модернизации спортивной площадки в образовательных организациях Волгоградской области составили 5 263,2 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета – 5 000,0 тыс. руб.; средства бюджета городского округа – город Камышин – 263,2 тыс. руб. (100,0%).

Как отмечалось, ожидаемым результатом реализации мероприятия муниципальной программы № 2140-п является модернизация спортивных площадок в общеобразовательных организациях Волгоградской области, плановый срок реализации данного мероприятия – 3 квартал 2024 года.

Однако, Школой плановый срок реализации мероприятия, установленный программой (3 квартал 2024 года) не соблюден. Модернизация спортивной площадки осуществлена в октябре 2024 года, то есть в 4 квартале 2024 года.

По вопросу 5. Проверка качества и объемов выполненных работ

В ходе проверки КСП проведено обследование (осмотр) в целях проверки качества и объемов выполненных работ в части исполнения мероприятия по модернизации спортивной площадки в образовательных организациях.

Осмотр спортивной площадки МБОУ СПШ № 9 проведён 17.06.2025, по результатам осмотра составлен Акт обследования (осмотра) № 1 от 17.06.2025 года.

В ходе осмотра установлено, что спортивная площадка имеет резиновое покрытие, установлены камни бортовые, ограждение, калитки, стойки баскетбольные и скамьи. Имеется повреждение одной панели металлического ограждения.

По факту повреждения секции ограждения спортивной площадки Учреждением сообщается: *«На 19.06.2025 связались с Подрядчиком для определения способа устранения повреждения. Так как Подрядчик не местный, то подъехать он сможет позже. После встречи с Подрядчиком сообщим о результатах и сроках устранения повреждения.»*

За пределами ограждения на открытой площадке также осуществлено устройство покрытия из резиновой крошки с установкой малых форм и тренажеров (турники, рукоход, скамья для пресса, бруссы, лавочки без спинки, урна).

В ходе обследования производилась фотосъемка (Акт обследования (осмотра) № 1).

В связи с осуществлением в здании МБОУ СШ № 9 капитального ремонта, спортивная площадка с даты приемки до даты проведения обследования (осмотра) не использовалась. Ввиду чего, оценить качественные характеристики и подверженность к износу в процессе эксплуатации спортивной площадки не представляется возможным.

По вопросу 6. Учет приобретенного имущества (выполненных работ)

Проверкой своевременности отражения в бухгалтерском учете работ по модернизации спортивной площадки в общеобразовательных организациях Волгоградской области установлено следующее:

В соответствии с карточками счетов за 2024 год выполненные работы, а также оплата по ним своевременно отражены в бухгалтерском учете на счете 302.28 «Расчеты по услугам, работам для целей капитальных вложений».

В соответствии с карточкой счета 101.00 «Основные средства» спортивная воркаут площадка также своевременно отражена в бухгалтерском учете.

Кроме того, согласно инвентарной карточке учета нефинансовых активов № Ш3101221 (ф. 0509215) сформированной по состоянию на 31.12.2024, спортивная воркаут площадка балансовой стоимостью 5 367,3 тыс. руб. принята к бухгалтерскому учету 17.10.2024 года. В балансовую стоимость объекта учета также включены расходы, источником которых являются внебюджетные средства, за проектные работы по договору в сумме 75,0 тыс. руб. (ООО «Зодчий») и инженерно-геодезические изыскания для проектирования спортивной площадки в сумме 29,1 тыс. руб. (МП г. Камышина «АПБ»).

Спортивная воркаут площадка закреплена за Школой на праве оперативного управления с на основании распоряжения Комитета по управлению имуществом Администрации городского округа – город Камышин от 28.12.2024 № 665 «О закреплении муниципального имущества за МБОУ СШ № 9 на праве оперативного управления».

Учреждением передача сведений о возникновении права на объект учета – спортивная воркаут площадка стоимостью 5 367,3 тыс. руб. в КУИ осуществлена с нарушением сроков, установленных п. 15 Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.10.2023 № 163н.

Решением «О Контрольно-счётной палате городского округа – город Камышин» от 29 сентября 2011 г. № 38 установлено, проведение контрольных мероприятий определяется Регламентом Контрольно-счётной палаты. Согласно Регламенту, руководство проверяемого учреждения в случае разногласий по акту проверки имеет право в пятидневный срок со дня получения акта представить мотивированные пояснения, замечания, возражения.

Начальник отдела КСП

Консультант КСП

Директор МБОУ СШ № 9

Главный бухгалтер МКУ ЦФМС



Н. В. Ерофеева

Е. А. Мазалова

Т. В. Кузнецова

Е. В. Кармазина

Акт обследования (осмотра) МБОУ СШ № 9

г. Камышин

17.06.2025 год

В рамках проверки законности и эффективности использования средств, направленных на реализацию мероприятия по соответствию зданий и прилегающей территории образовательных учреждений государственным нормам и требованиям, обеспечивающим безопасные условия воспитания, обучения и получения дополнительного образования за 2024 год проведено обследование (осмотр) выполненных работ и имущества, приобретенных МБОУ СШ № 9 в рамках субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на модернизацию спортивных площадок в общеобразовательных организациях Волгоградской области (соглашение от 29.12.2023 № 23), направленной на реализацию мероприятия «Модернизация спортивных площадок в образовательных организациях».

Обследование проведено по адресу: Волгоградская обл., г. Камышин, 6 мкр., д. 15.

Обследование проведено начальником отдела Контрольно-счетной палаты городского округа – город Камышин (далее – КСП) Ерофеевой Н. В., консультантом КСП Мазаловой Е. А., в присутствии заведующего хозяйством МБОУ СШ № 9 Сорокопудовой А. Г.

Информация о результатах обследования спортивной воркаут площадки:



№ п/п	Наименование	Количество		Примечание
		По акту	Фактическое наличие	
Контракт с ИП Давтян на сумму 4 263 157,98 руб.				
1	Камни бортовые 100-20-8 (см)	192 шт.	192 шт.	-
2	Резиновое покрытие	480 м²	480 м²	(30 м * 16 м)
3	Столбы металлические 80*80*2*5000 мм	40 шт.	40 шт.	-
4	Панель Premium-perimetr 2030*2500 (заграждение металл. решетчат.)	78 шт.	78 шт.	1 панель повреждена (изогнута)
5	Калитка из решетчат. панелей 2,0*1,0 м	2 шт.	2 шт.	-
6	Стойка баскетбольная уличная	2 шт.	2 шт.	-
7	Стойка волейбольная универсальная с механизмом натяжения, в стаканах с крышками	2 шт.	2 шт.	находится в здании склада (теплица)
8	Сетка волейбольная	1 шт.	1 шт.	находится в помещении библиотеки
9	Сетка баскетбольная	2 шт.	2 шт.	находится в помещении библиотеки
10	Скамья без спинки	4 шт.	4 шт.	-

В ходе осмотра установлено, что спортивная площадка имеет резиновое покрытие, установлены камни бортовые, ограждение, калитки, стойки баскетбольные и скамьи.

№ п/п	Наименование	Количество		Примечание
		По акту	Фактическое наличие	
Договор с ИП Давтян на сумму 570 550,00 руб.				
1	Камни бортовые 100-20-8 (см)	36,4 шт.	36,4 шт.	-
2	Резиновое покрытие	78,5 м²	78,5 м²	(31,4 м * 2,5 м)
Договор с ИП Бородин на сумму 429 450,02 руб.				
1	Турник классический	2 шт.	2 шт.	-
2	Рукоход двойной разноуровневый	1 шт.	1 шт.	-
3	Скамья для пресса	1 шт.	1 шт.	-
4	Брусья двойные разноуровневые	1 шт.	1 шт.	-
5	Лавочка без спинки	2 шт.	2 шт.	-
6	Урна	1 шт.	1 шт.	-

За пределами ограждения на открытой площадке также осуществлено устройство покрытия из резиновой крошки с установкой тренажеров.

В ходе обследования производилась фотосъемка.

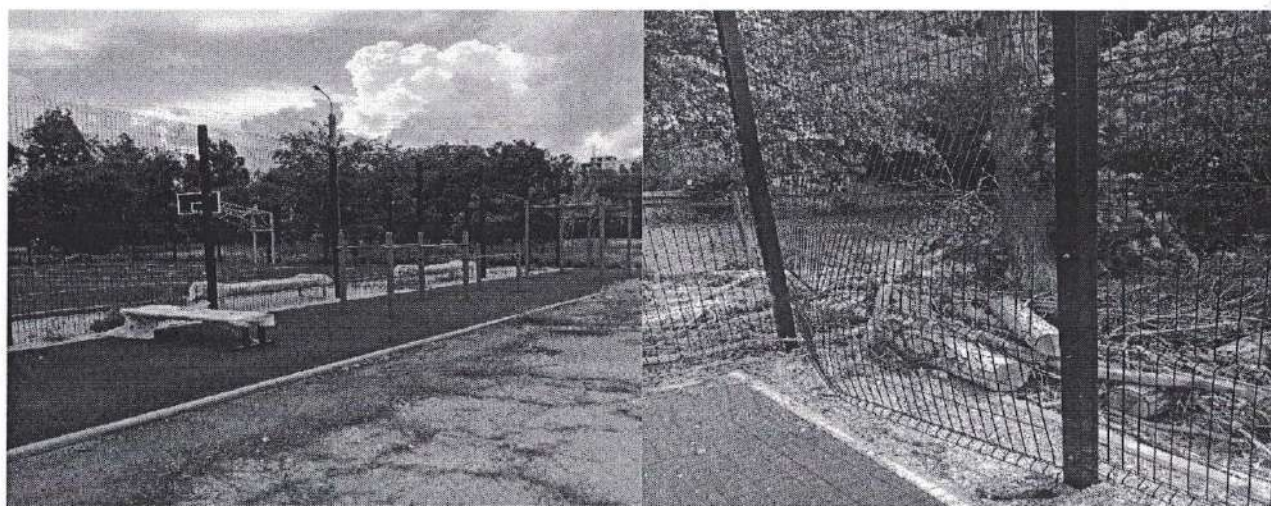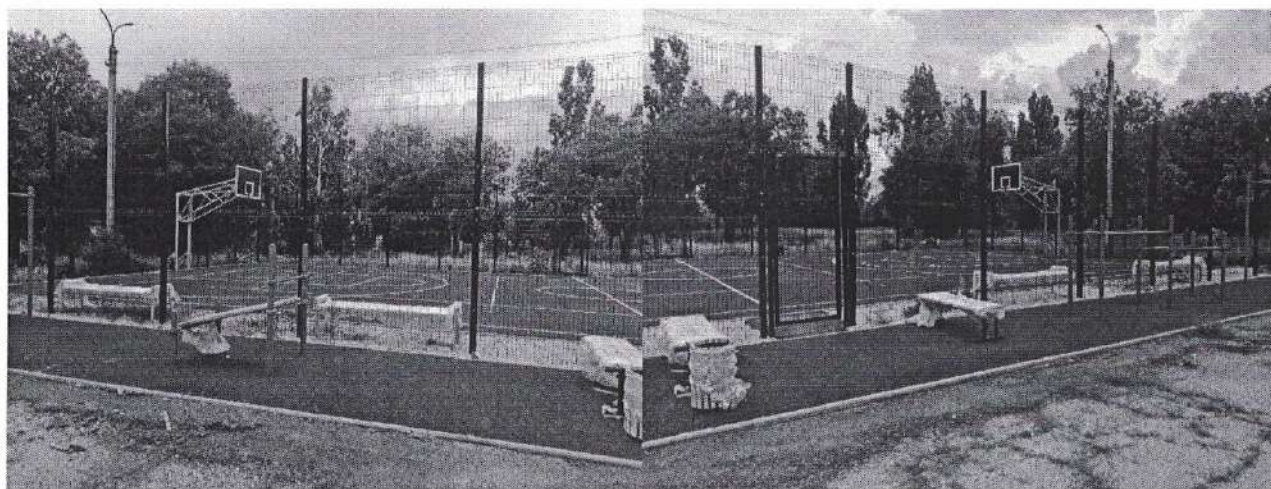

В связи с осуществлением в здании МБОУ СШ № 9 капитального ремонта, спортивная площадка с даты приемки до даты проведения обследования (осмотра) не использовалась.

Начальник отдела КСП

Ерофеева Н. В.

Консультант КСП

Мазалова Е. А.

Заведующий хозяйством МБОУ СШ № 9

Сорокопудова А. Г.

Муниципальное казённое учреждение "Центр финансового и методического сопровождения"
(наименование организации)

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код

Приказ

Номер документа	Дата составления
75	02.06.2025

Предоставить отпуск

Кармазиной Елене Викторовне

Табельный номер

отдел учёта и отчётности

(структурное подразделение)

начальник отдела - главный бухгалтер

за период работы с " 20 " декабря 20 24 г. по " 19 " декабря 20 25 г.

А. ежегодный основной оплачиваемый отпуск на

14

календарных дней

с " 16 " июня 20 25 по " 29 " июня 20 25 г.

и (или)

(ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, учебный, без сохранения заработной платы и другие (указать))

на

календарных дней

" 20 " по " 20 " г.

В. Всего отпуск на

14

календарных дней

" 16 " июня 20 25 по " 29 " июня 20 25 г.

Исполнение обязанностей начальника отдела - главного бухгалтера возложить на Толмачёву Т.Г., заместителя начальника отдела - заместителя главного бухгалтера.

Директор МКУ ЦФМС

КОПИЯ
ВЕРНА

(личная подпись)

М.В.Саутенко

(расшифровка подписи)

С приказом () работник ознакомлен

(личная подпись)

" 02 " 06.2025

Сотисина

Толмачёва Т.Г. 02.06.2025г.
